




वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
पूर्वाधार/योजना विकास शाखा
ढकारी गाउँपालिका, अछाम ।
आ.व. २०८१/०८२



(Handwritten signature)

पेश गर्ने

नाम - गौतम बिष्ट

पद- पूर्वाधार शाखा प्रमुख

ढकारी गाउँपालिका, अछाम

मिति-२०८२/०३/३०

पुर्वाधार विकास शाखाको प्रतिवेदन



१. परिचय:-

ढकारी गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाडी जिल्ला अछाम मा पर्ने स्थानिय तह हो। स्थानिय तह संचालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार यस ढकारी गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको विकास सम्बन्धि निर्माण कार्यको संचालनको लागि गा.पा. को योजना शाखाले काम गर्ने गरेको छ। यस शाखाको मुख्य कार्य भनेको विकास निर्माणका कार्यहरु विधि सम्मत ढंगले होस् उक्त निर्माण कार्यहरु विवाद रहित होउन भन्ने हो।

यस विषयलाई ध्यानमा राखि ढकारी गाउँपालिकाको १ देखी ८ वटै वडाहरुका उपभोक्ता समिति र नागरिकलाई सफलतापूर्वक निर्माण योजनाहरुको कार्य सम्पन्न गर्न यस आ.व. २०८१/०८२ को प्रतिवेदन यसप्रकार छ।

२. उद्देश्य :-

- ढकारी गाउँपालिका भित्रका १ देखी ८ वटै वडाहरुमा विकास निर्माणका कार्यहरु योजनाबद्ध रुपमा संचालन गर्ने।
- पालिकाले विकास निर्माणका लागि प्राप्त गरेको बजेटको सहि सदुपयोग गर्ने।
- प्रदेश / सघं बाट बिनियोजित बजेटले पालिकाको विकासको लागी सहि सदुपयोग गर्ने।
- गुणस्तरिय निर्माण कार्य गर्न।
- ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको सहि सदुपयोग गर्न।

३. औचित्यहरु :-

ढकारी गाउँपालिका भित्र योजना कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ति, गुणस्तरिय काम गराईको कमी, मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न नचाहने स्थानिय समाज, ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधि बारे अनविज्ञता तथा जनचेतना को कमी रहेकोले यस पुर्वाधार विकास शाखाको प्रभावकारिता आवश्यक देखिएको हो।

४. क्रियाकलापहरु:-


- योजनाहरुको वातावरणिय परिक्षण, सम्भाव्यता पहिचान - योजना माग गर्नुभन्दा पहिला त्यस योजनाले पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको अध्ययन गरि मुल्यांकन गर्ने।
- बजेटको सहि सदुपयोग - प्रत्येक वर्ष गाउँपालिकामा आउने बजेट आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणका संरचनाहरुका लागि सदुपयोग गराउने।
- निर्माण योजनाहरुको निगरानि तथा अनुगमन - काम सुरु भइसकेपछि बिच बिचमा र काम पुरा भइसकेपछि प्राविधिक टीम सहित कामको गुणस्तर र आइपर्ने समस्या समाधानका लागि योजना निर्माण कार्य स्थलमा नियमित जाने।

पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यालयको भूगर्भीय प्रतिवेदन




- अन्तिम बिल भुक्तानिका लागि टिप्पणी आदेशहरूको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा योजना को काम पुरा भइसकेपछि अनुगमन गराउने र डिजाइन र एष्टिमेट अनुसार काम भए नभएको चेक जाँच गरि अन्तिम बिल भुक्तानिका लागि लिखित टिप्पणि आदेश दिने।
- योजनाहरूको सर्भेक्षण।
- निर्माण योजनाहरूको लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- निर्माण योजनाहरूको सुपरभिजन तथा अनुगमन गर्ने ।
- अन्तिम बिल भुक्तानी भन्दा पहिला काम पुरा भइसकेका योजनाहरूको गुणस्तर तथा परिमाण को नाप जाँच।
- मापदण्ड पुर्याएर बनेका योजनाहरूको कार्य सम्पादन बिल तयार गर्ने।
- गाउँपालिका भित्रका विकास निर्माणका योजनाहरू गुणस्तरयुक्त र मापदण्ड भित्र रहि काम गर्न मद्दत गर्ने।

५. पुर्वाधार विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू

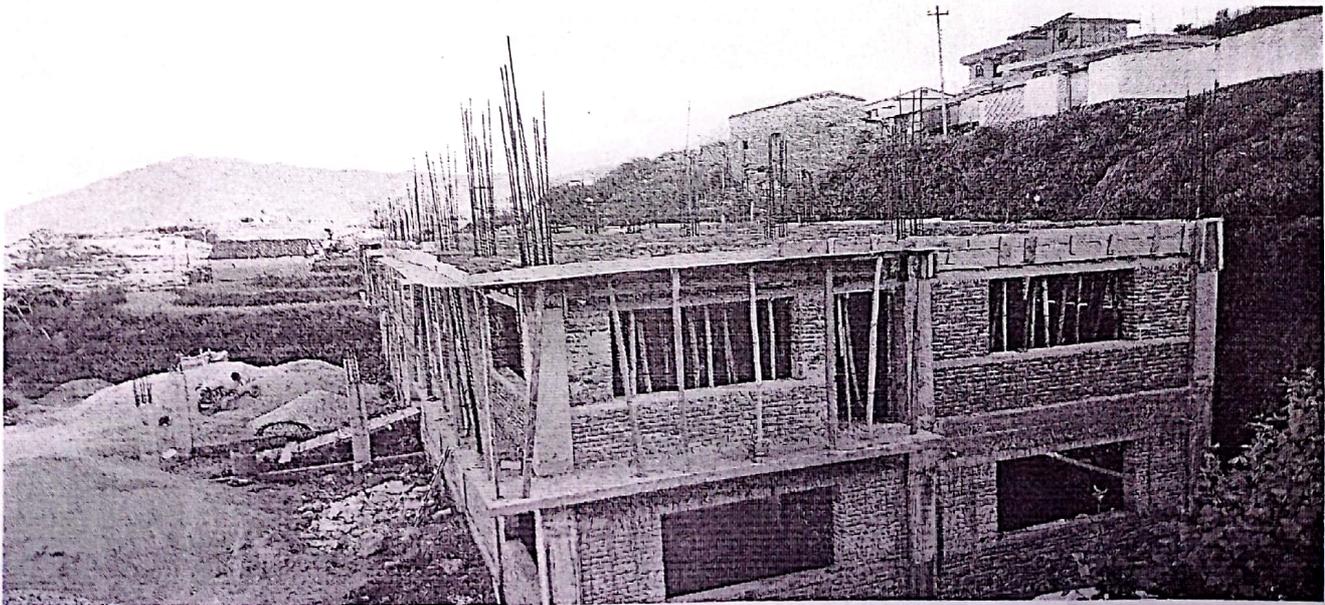

पुर्वाधार विकास शाखाको विकास कार्यको प्रतिवेदन

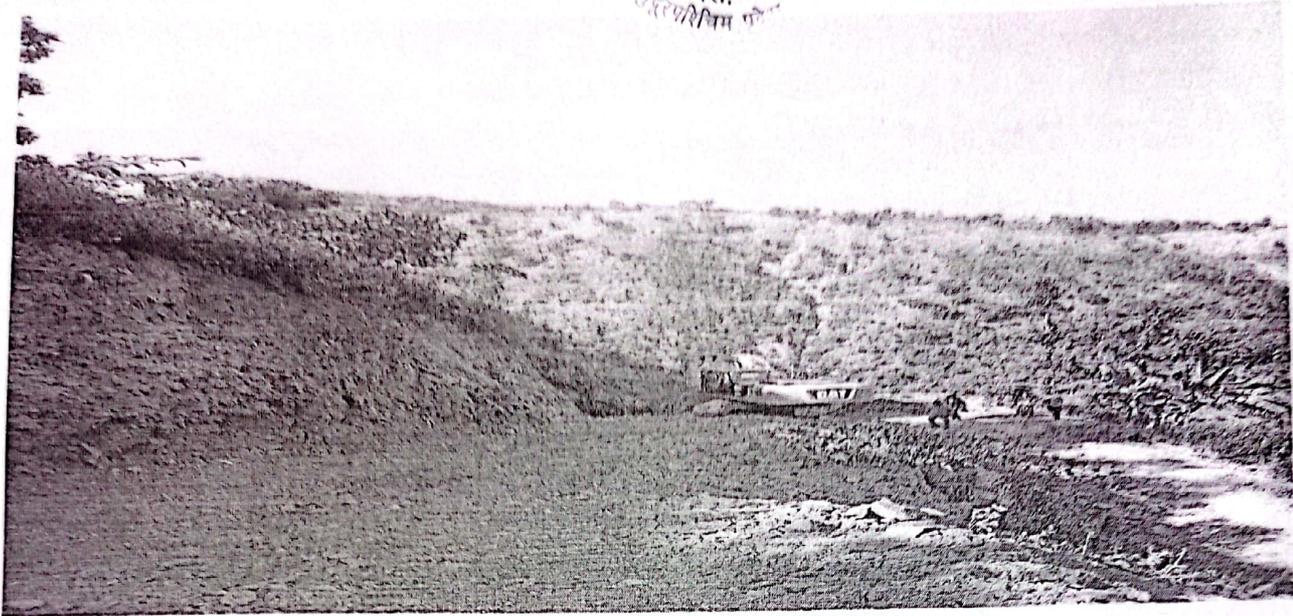

पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यालय, काठमाडौं
पुष्पाली प्रतिवेदन



पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यप्रणाली प्रतिवेदन



६. योजना शाखाको यस वर्षको कार्यको मुख्य विषयवस्तुहरु:-

- उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन।
- निर्माण समितिको कर्तव्य भूमिका तथा जिम्मेवारी अवगत गराउने।
- परियोजनाको गुणस्तरको सुनिश्चिता।
- परियोजना अनुगमन।
- परियोजना कार्यन्वयन प्रक्रिया तथा समझौताको आवश्यक पर्ने कागजातहरु चेकजाँच।
- उपभोक्ता समिति परिचालनका सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान।
- निर्माण कार्यको मुल्याङ्कन।
- प्रत्येक निर्माण योजनाको अभिलेखिकरण।
- योजना खाता फाराम भर्ने।

७. यस आ.व. का मुख्य सवालहरु :-

- समयमा समझौता नहुने समस्या :- योजना शाखाबाट योजनाको समझौता कार्य नयाँ आ.व.सुरु हुने बित्तकै हुने भएता पनि उपभोक्ता समितिले चासो नदिने गर्नाले निर्माण कार्यहरु ढिलो सम्पन्न हुने गरेको।
- पेशिक रकम नपाउने समस्या:- उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु ज्यालादारिमा काम गर्ने अत्यन्त दयनिय अवस्थाका मान्छे पनि हुने गरेको पाइन्छ। यसतो अवस्थामा पेशिक नलिकान काम सुरु गर्न समस्या देखिने गरेको छ।
- जिल्ला दर रेटका कारण समस्याहरु :- समझौताको समयमा लागत अनुमान मा रेट एउटा हुने तर केहि समय प्रश्नात निर्माण सामग्रिको मुल्य पसलमा ह्रास बढ्ने भएकोले निर्माणकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम भित्र सबै काम गुणस्तरिय बनाउन मुस्किल हुने गरेको।
- उपभोक्ता तथा निर्माण समितिले गर्दा हुने समस्या:- सुरक्षित आवास तथा दिगो विकास निर्माणका लागि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग, मापडण्ड तथा डिजाइन प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ तर पुरानै चलन अनुसार काम गर्न रुचाउने समाजका कारण प्राविधिकहरुलाई समस्या भोग्नुपरेको छ।

८. मुख्य चुनौतिहरु:-

- क्षमताका आधारमा समितिका पदाधिकारिहरुको चयन।
- कार्यविधिबारे सचेतिकरण र क्षमता विकास।
- समयमा योजना समझौता।
- कार्यविधिको पुर्ण पालना एवम कार्यन्वयन।
- योजनाको उचित दस्तावेजिकरण र प्रमाण संकलन।
- बजार मुल्य अनुसार जिल्ला दर रेट निर्धारण।
- उचित अनुगमनको लागि प्रविधिको दिगो प्रयोग।
- उपभोक्ता समितिको यथोचित मार्गदर्शन गर्ने।

पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यविधि प्रगती प्रतिवेदन



- योजनाको पुर्ण रुपमा अपनत्व ग्रहण गराउने प्रविधि प्रयोग।
- ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिका प्रयोग।
- सवारी-साधन र भौतिक सामग्रीहरूको कमी।
- नयाँ प्रविधि सम्बन्धि क्षमाता विकासका लागि तालिम।

९. अवसर एवम सुझावहरू:-

- पालिकाबाट वार्षिक रुपमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन र बजेट विनियोजन।
- योजना सम्झौतामा हुने ढिलाईका कारण समयमा योजनाहरू सम्पन्न नहुने र गुणस्तरिय रुपमा सम्पन्न नहुने हुदा समयमा योजना सम्झौता गर्न जरुरी।
- समय समयमा प्राविधिकहरूको लागि नयाँ प्रविधि सम्बन्धि तालिम व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिका प्रयोगका फाइदाहरू बारे जनचेतना स्वरुप कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- योजना कार्यान्वयनका समयमा दर रेट अनुसार व्यवसायीले मालसामान बिक्री गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन।
- योजना र लाभामित घरधुरिको प्रकृति र संख्या अनुसार ५ लाख भन्दा मुनिका योजनाका लागि समेत पेस्कि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था।
- आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिको गतिविधि अनुगमन।

१०. पुर्वाधार विकास शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू :-

- उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन।
- निर्माण समितिको कर्तव्य भुमिका तथा जिम्मेवारी अवगत गराउने।
- परियोजनाको गुणस्तरको सुनिश्चिता।
- परियोजना अनुगमन।
- परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सम्झौताको आवश्यक पर्ने कागजातहरू चेकजाँच।
- उपभोक्ता समिति परिचालनका सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान।
- निर्माण कार्यको मुल्याङ्कन।
- प्रत्येक निर्माण योजनाको अभिलेखिकरण।
- योजना खाता फाराम भर्ने।

११. योजनाहरूको प्रगती विवरण

प्रदेश स्तरीय योजनाहरू

स.	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगती	वित्तीय प्रगती	कैफियत
	खानेपानी निर्माण मगर टोल मैथुम	ढकारी गा.पा. वडा नं. - ०६	३५,००,०००	१००%	१००%	

पुर्वाधार विकास शाखाको बालबिकास प्रगती प्रतिवेदन



निर्माण	ढकरी वडा नं.	०७	०००		
११ सर-स्वतीआ.वि.शौचालय मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,००,०००	१००%	१००%	
१२ बुढाखोलाखा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,५०,०००	१००%	१००%	
१३ साङ्ढ्टिखोलास्याराआम सिँचाइ कुलो मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,००,०००	६०%	२०%	
१४ स्वास्थ्यचौकी भवन मर्मत तथा सामान खरिद	ढकरी वडा नं. ०७	२,५०,०००	१००%	१००%	
१५ कुन्ताखोलालिडे मेला रूज खा.पा. मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,५०,०००	५५%	२०%	
१६ बुकाखोलाखा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	५०,०००	६७%	२०%	
१७ पतान खोलाखा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	२,००,०००	८०%	२०%	
१८ चडिपानी मुहान पाल्ता खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	३,००,०००	१००%	१००%	
१९ मनकामना मा.वि.भवन निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	२,००,०००	१००%	१००%	
२० बलाता खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	३,००,०००	१००%	१००%	
२१ सूर्योदय बालविकास केन्द्र खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	२,००,०००	१००%	१००%	
२२ कुल्लिमड खानेपानी मर्मत तथा कागेस्रवरी आ.वि.शौचालय मर्मत	ढकरी वडा नं. ०४	४,५०,०००	१००%	१००%	
२३ चोटकेसैन दाउनामारा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०४	२,००,०००	१००%	१००%	
२४ बलाता स्वास्थ्य चौकी फिल्ड कटिङ्ग	ढकरी वडा नं. ०४	३,००,०००	१००%	१००%	
२५ बण्डाली थान फिल्ड कटिङ्ग	ढकरी वडा नं. ०४	१,८०,०००	१००%	१००%	
२६ कालिका देवी मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	१,५०,०००	१००%	१००%	
२७ धौनीगाड आधुनिक घट्ट निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	८०,०००	७०%	२०%	
२८ जुके खानपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	३,००,०००	१००%	१००%	
२९ चिउरीरूख खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	३,००,०००	१००%	१००%	
३० रिमाडाँडा बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	१,५०,०००	१००%	१००%	
३१ बण्डालीमाडु मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	२,५०,०००	१००%	१००%	
३२ आसिपलाउने खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०१	५०,०००	१००%	१००%	
३३ विध्यानिकास आ.वि. भवन मर्मत	ढकरी वडा नं. ०१	२,००,०००	८०%	०%	

पुर्वाधार विकास शाखाको वार्षिक प्रतिवेदन



क्र.सं.	कार्यको विवरण	ढकरी वडा नं.	अनुमानित लागत (रु.)	समाप्त प्रतिशत	अवशेष प्रतिशत
३४	खडिकारूख मुहान बजारखाल खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०१	१,००,०००	६०%	२०%
३५	धामीबगे खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०१	३,००,०००	६०%	२०%
३६	डुफा गाऊँघर क्लिनिक भवन निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	१,५०,०००	६०%	२०%
३७	बण्डालीमाडु मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	२,५०,०००	६०%	२०%
३८	घुडखोला सिंचाई कुलो निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	१,००,०००	६०%	२०%
३९	सिन्कीधारा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	१,००,०००	६०%	२०%
४०	गौरेलाखोला खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०१	५०,०००	६०%	२०%
४१	जबदमुहान काफलरूख खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०१	१,५०,०००	१००%	१००%
४२	धाराखाल खेरेचौकी बास्खोला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,२०,०००	१००%	१००%
४३	केलाडी नवखेत डडेय खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४४	बासपानी खकानेपानी मुलसुधार	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	१००%	१००%
४५	डुमप-नी खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४६	सिलीपडा डाडाथाई खानेपानीमर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४७	आरन व्यवस्थापन (टेक बहादुर वि.क.)	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	१००%	१००%
४८	वि.पि स्मृति आ.वि. भबवन मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४९	गत आ.व को विधुत जडान तिर्न बाँकी	ढकरी वडा नं. ०८	१,२८,०००	१००%	१००%
५०	सुगरखाल खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	६०%	२०%
५१	शिशु सुधार आ.वि. खेलमैदान निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,७५,०००	६०%	२०%
५२	मंग्रा कालिकाथान मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	२,००,०००	६०%	२०%
५३	फासडुग्रा पितर मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,२०,०००	६०%	२०%
५४	पिटुकाखोला साजडाँडा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	६०%	२०%
५५	देवल देउतिबज्ये मन्दिर धरापर्खाल निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,३०,०००	६०%	२०%
५६	मेल्वारखाल कालिकाथान मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	२,००,०००	६०%	२०%
५७	घोडासेन स्वास्थ्य चौकी शौचालय मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	६०%	२०%

पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यालय, धरमपुरी प्रतिवेदन



५८	पिपल खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
५९	ठाँटखाल पिपल चौतारो निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	८०%	२०%
६०	खानेपानी तथा सिँचाइको लागी पाइप खरिद	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
६१	त्रिपुरासुन्दरी मा.वि. सि.सि.क्यामेरा जडान	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
६२	हुलामडा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
६३	सोतर फाल्ने खोला मुहान खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०६	६०,०००	१००%	१००%
६४	पञ्चज्योति आ.वि. खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०६	१,५०,०००	१००%	१००%
६५	शान्ति आ.वि. फर्निचर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	८०,०००	१००%	१००%
६६	खडिपानी ग्रामीण सडक निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	१५,००,०००	२०%	०%
६७	धानवीड सडक निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	८,००,०००	२०%	०%
६८	पञ्चकन्या आ.वि. घेरा पर्खाल निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	३,००,०००	१००%	१००%
६९	काउलेगडा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	१,००,०००	१००%	१००%
७०	पडापानी नवदुर्गा मनकामना आ.वि.सडक निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	५,३०,०००	१००%	१००%
७१	बासेन ग्रामीण सडक निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	३,५०,०००	१००%	१००%
७२	सिम गाढ खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	१,००,०००	८०%	२०%
७३	तल्लो स्वाड सिँचाइ कुलो निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	५,००,०००	८०%	२०%
७४	भरकुडा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०६	१,००,०००	८०%	२०%
७५	बराखुर्द खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०६	१,००,०००	८०%	२०%
७६	फुडुला गैराघर सिमाने खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	१,५०,०००	८०%	२०%
७७	मिल खेत सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०६	१,५०,०००	८०%	२०%
७८	मष्टा देवता मन्दिर मर्मत	ढकरी वडा नं. ०६	१,००,०००	८०%	२०%
७९	गतेपानी खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	२,००,०००	१००%	१००%
८०	गैरीखोला मुहान पारी गडेम खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,५०,०००	१००%	१००%

पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यालय, कैलाली प्रदेश, नेपाल



८१	नायकबाडा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%
८२	छणाखोला मुहान तल्लो बागबेते कानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%
८३	कालिका मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	२,००,०००	१००%	१००%
८४	मालिका आ.वि. शोचालय निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%
८५	स्याङ्लावन माटेथान निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%
८६	तल्लो बागबेते सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,५०,०००	१००%	१००%
८७	वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको चेन गेट निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	२,००,०००	१००%	१००%
८८	माटिखडुन मुहान झ्याडिसल्ला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%
८९	गोठामेला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%
९०	तल्लो रिखेनाउला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	५०,०००	१००%	१००%
९१	जुकेपानी मुहान मुललो ठूलासेन खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	०	८०%	२०%
९२	कनेपानी मुहान ताली खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३		८०%	२०%
९३	रिखेनाला मुहान ढङ्नेटा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३		८०%	२०%
९४	डुमबाडडा मुहान सुनातबाडा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०२	१०,०००	१००%	१००%
९५	टुनिगैरा सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	२,००,०००	१००%	१००%
९६	भुजनी सिचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%
९७	ज्ञानमन्दिर मा.वि फर्निचर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	१००%
९८	जाल्पादेवी मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%
९९	ढकारी गा.पा. वडा नं. २ र ५ को सबै योजनाहरू समझौता भईसकेको	ढकारी गा.पा. वडा नं. ०२ र ०५	काम सबै सम्पन्न भएको	१००%	२०%
१००	टुनिगैरा सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	२,००,०००	१००%	१००%
१०१	भुजनी सिचाइ पोखरी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%
१०२	ज्ञानमन्दिर मा.वि फर्निचर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	१००%
१०३	जाल्पादेवी मन्दिर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%
१०४	साजरुख खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	२०%

पुर्वाधार विकास शाखाको कार्यालय, प्रमती प्रतिवेदन



१०५	कापडाखोला खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	००	१००%	२०%
१०६	कनेडाखोला खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,००	१००%	२०%
१०७	केनपुर स्वास्थ्य चौकी खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,००	१००%	२०%
१०८	मल्लोतेक खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,००	१००%	२०%
१०९	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई मेकाडाडा फर्निचर व्यवस्थापन	ढकारी वडा नं. ०५	५०,००	१००%	२०%
११०	केलामुल खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,००	१००%	२०%
१११	बुढाखोला सिचाई कुलो मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	२,००,००	१००%	२०%
११२	कालसेन धान निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,००	१००%	२०%
११३	भैरवधान मन्दिर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,००	१००%	२०%
११४	नवदुर्गा मन्दिर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,००	१००%	२०%
११५	ज्ञानमन्दिर फर्निचर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,००	१००%	२०%
११६	गोकुल आ.वि. फर्निचर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,००	१००%	२०%
११७	बलातीबाडा फाटाबगर ग्राविल तथा सडक मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	४,००,००	२०%	१००%
११८	कालिका देवि मा.वि. खानेपानी निर्माण योजना	ढकारी वडा नं. ०२	४,००,००	२०%	०%
११९	वडा कार्यालय गेट निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	२,५०,००	१००%	१००%
१२०	गाउँघर क्रिानिक भवन निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	३,००,००	१००%	१००%
१२१	मार्थेग सिँचाई पोखरी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,००	१००%	१००%
१२२	गाणपानी मुहान नेपाली टोल खा.पा.निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	१,५०,००	१००%	२०%
१२३	बुढाखोला मुहान सिंहटोल लहरबाडा खानेपानी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,००	१००%	१००%
१२४	सावखोला पोखरी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	१०,००	१००%	१००%
१२५	छोटा भलाने खा.पा. मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५०,००	१००%	१००%
१२६	जुन बग्ने ठकुरी टोल बलातीबाडा खा.पा.	ढकारी वडा नं. ०२	२,८०,००	१००%	१००%
१२७	तल्लो भकुरेगढा खा.पा.मुलसुधार	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,००	१००%	२०%

पुर्वाधार विकास शाखाको बजेटिको प्रगती प्रतिवेदन

१२८	बण्डालीमाडु खा.पा मर्मत	ढकारी वडा		१००%	२०%
१२९	चलाउने टोल फाटाबगर खा.पा. मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५२,०० ०	१००%	१००%
१३०	हिच्मा स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,० ००	१००%	१००%
१३१	दुन्ता बालविकास केन्द्र फर्निचर खरिद	ढकारी वडा नं. ०२	५०,०० ०	१००%	२०%
१३२	श्री ज्ञानदीप बालविकास केन्द्र खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५०,०० ०	१००%	१००%
१३३	वडा कार्यालय फर्निचर खरीद	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,० ००	१००%	१००%

११.निष्कर्ष:-

आ.व. २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म लगभग सबै योजनाहरुको भुक्तानी भइसकेको छ। निर्माण कार्यहरुको अनुगमन गरी सम्पन्न भइसकेका निर्माण योजनाहरुको अन्तिम बिल पेश गरियो केहि मात्रामा योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन्। सम्पन्न भइसकेका निर्माण योजनाहरु गुणस्तरिय एवं विवाद रहित रुपमा सम्पन्न भएका छन्। बहुबर्षिय ठेक्काका योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन्।

पेश गर्ने:-

(Signature)
