


योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन



योजना/पुर्वाधार विकास शाखा

ढकारी गाउँपालिका, अछाम

आ.व. २०८१/०८२



पेश गर्ने:-

नाम :- चन्दा कुमारी चौधरी

योजना शाखा प्रमुख

ढकारी गाउँपालिका, अछाम

मिति-२०८२/०३/३१

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

बिषयवस्तु

१. परिचय
२. उद्देश्य
३. औचित्य
४. क्रियाकलापहरु
५. पुर्वाधार विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु
६. योजना शाखाको यस बर्षको कार्यको मुख्य बिषयवस्तुहरु
७. यस आ.व. का मुख्य सवालहरु
८. मुख्य चुनौतिहरु
९. अवसर एवम सुझावहरु
१०. योजना शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु
११. योजनाहरुको प्रगती विवरण
१२. निष्कर्ष

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

परिचय:-

ढकारी गाउँपालिका सुदुरपश्चिम प्रदेश पहाडी जिल्ला अछाम मा पर्ने स्थानिय तह हो।स्थानिय तह संचालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार यस ढकारी गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको विकाससम्बन्धि निर्माण कार्यको संचालनको लागि गा.पा. को योजना शाखाले काम गर्ने गरेको छ।यस शाखाको मुख्य कार्य भनेको विकास निर्माणका कार्यहरु विधि सम्मत ढंगले होस् उक्त निर्माण कार्यहरु विवाद रहित होउन भन्ने हो।

यस विषयलाई ध्यानमा राखि ढकारी गाउँपालिकाको १ देखी ८ वटै वडाहरुका उपभोक्ता समिति र नागरिकलाई सफलतापूर्वक निर्माण योजनाहरुको कार्य सम्पन्न गर्न यस आ.व. २०८०/०८१ को प्रतिवेदन यसप्रकार छ।

१. उद्देश्य :-

- ढकारी गाउँपालिका भित्रका १ देखी ८ वटै वडाहरुमा विकास निर्माणका कार्यहरु योजनाबद्ध रुपमा संचालन गर्ने।
- पालिकाले विकास निर्माणका लागि प्राप्त गरेको बजेटको सहि सदुपयोग गर्ने।
- प्रदेश / सघं बाट बिनियोजित बजेटले पालिकाको विकासको लागि सही सदुपयोग गर्ने ।
- गुणस्तरिय निर्माण कार्य गर्ने।
- ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको सहि सदुपयोग गर्ने।

२. औचित्यहरु :-

ढकारी गाउँपालिका भित्र योजना कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ति,गुणस्तरिय काम गराईको कमी,मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न नचाहने स्थानिय समाज,ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधि बारे अनविज्ञता तथा जनचेतना को कमी रहेकोले यस योजना विकास शाखाको प्रभावकारिता आवश्यक देखिएको हो।


योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

३. क्रियाकलापहरु:-


- योजनाहरुको वातावरणिय परिक्षण, सम्भाव्यता पहिचान - योजना माग गर्नुभन्दा पहिला त्यस योजनाले पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको अध्ययन गरि मुल्यांकन गर्ने।
- बजेटको सहि सदुपयोग -प्रत्येक बर्ष गाउँपालिकामा आउने बजेट आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणका संरचनाहरुका लागि सदुपयोग गराउने।
- निर्माण योजनाहरुको निगरानि तथा अनुगमन -काम सुरु भइसकेपछि बिच बिचमा र काम पुरा भइसकेपछि प्राविधिक टीम सहित कामको गुणस्तर र आइपर्ने समस्या समाधानका लागि योजना निर्माण कार्य स्थलमा नियमित जाने।
- अन्तिम बिल भुक्तानिका लागि टिप्पणी आदेश - पालिकाको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा योजना को काम पुरा भइसकेपछि अनुगमन गराउने रडिजाइन र एष्टिमेट अनुसार काम भए नभएको चेक जाँच गरि अन्तिम बिल भुक्तानिका लागि लिखित टिप्पणि आदेश दिने।
- योजनाहरुको सर्भेक्षण।
- निर्माण योजनाहरुको लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- निर्माण योजनाहरुको सुपरभिजन तथा अनुगमन गर्ने ।
- अन्तिम बिल भुक्तानी भन्दा पहिला काम पुरा भइसकेका योजनाहरुको गुणस्तर तथा परिमाण को नाप जाँच।
- मापदण्ड पुर्याएर बनेका योजनाहरुको कार्य सम्पादन बिल तयार गर्ने।
- गाउँपालिका भित्रका विकास निर्माणका योजनाहरु गुणस्तरयुक्त र मापदण्ड भित्र रहि काम गर्न मदत गर्ने।

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

४.पुर्वाधार विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु ।

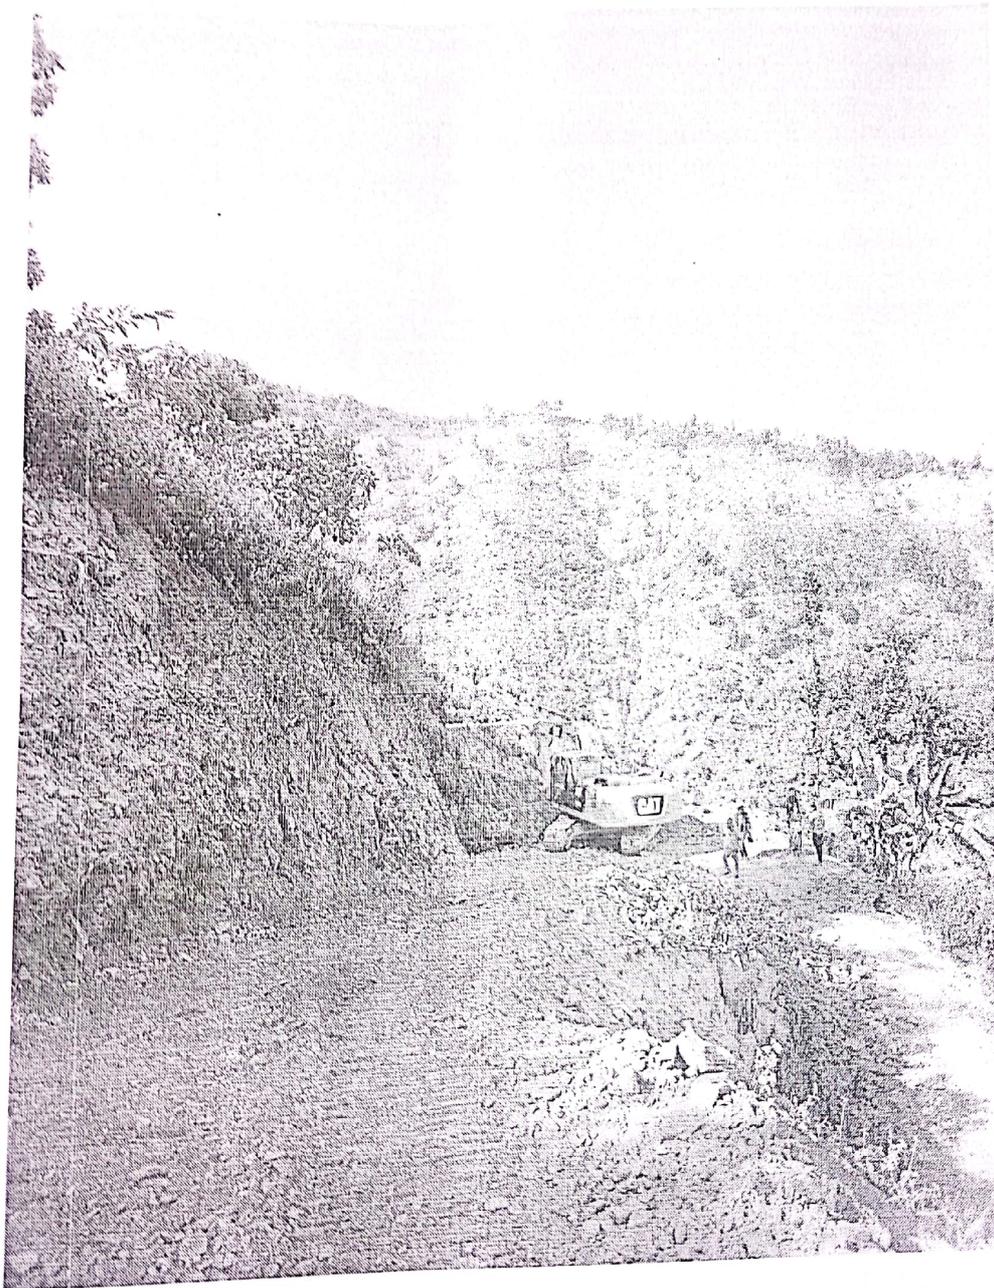


योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

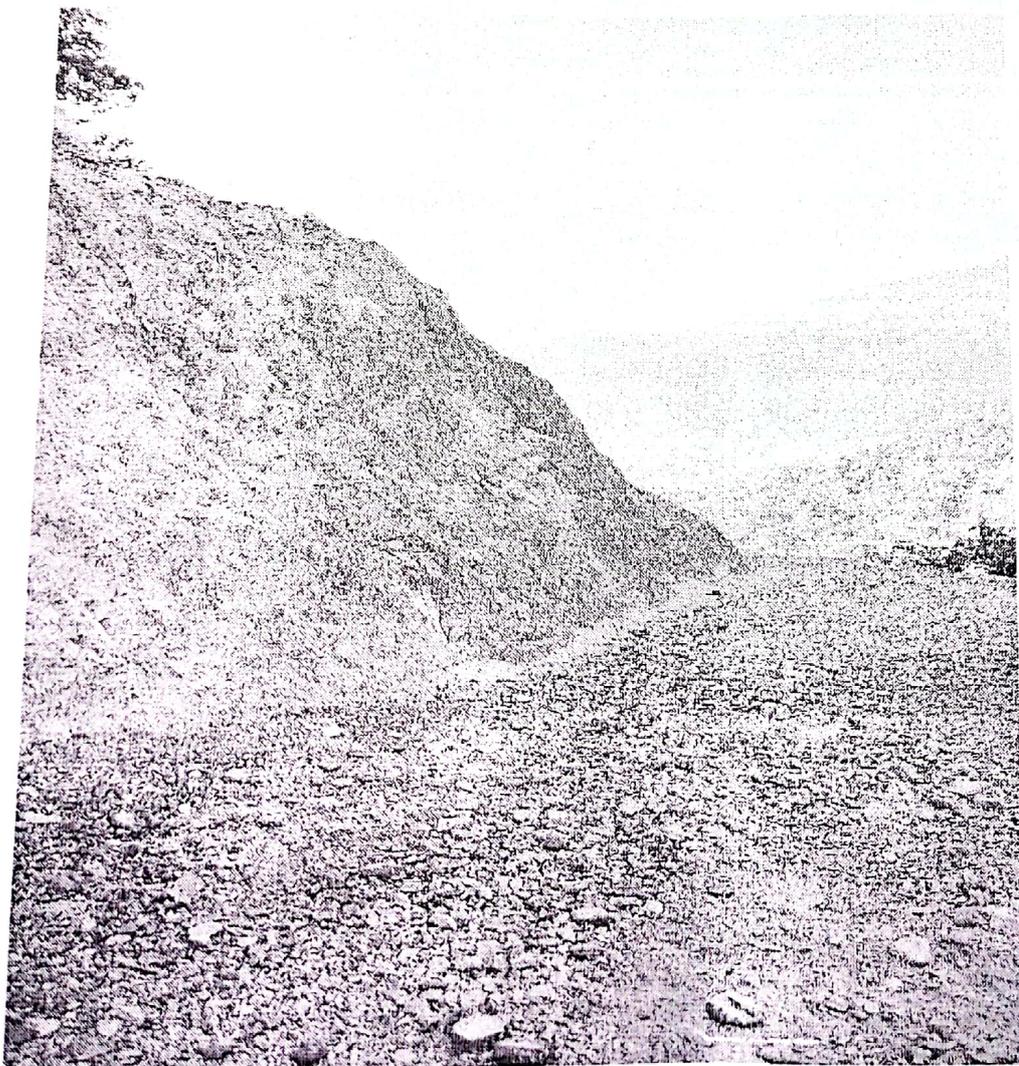



योजना शाखाको दार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

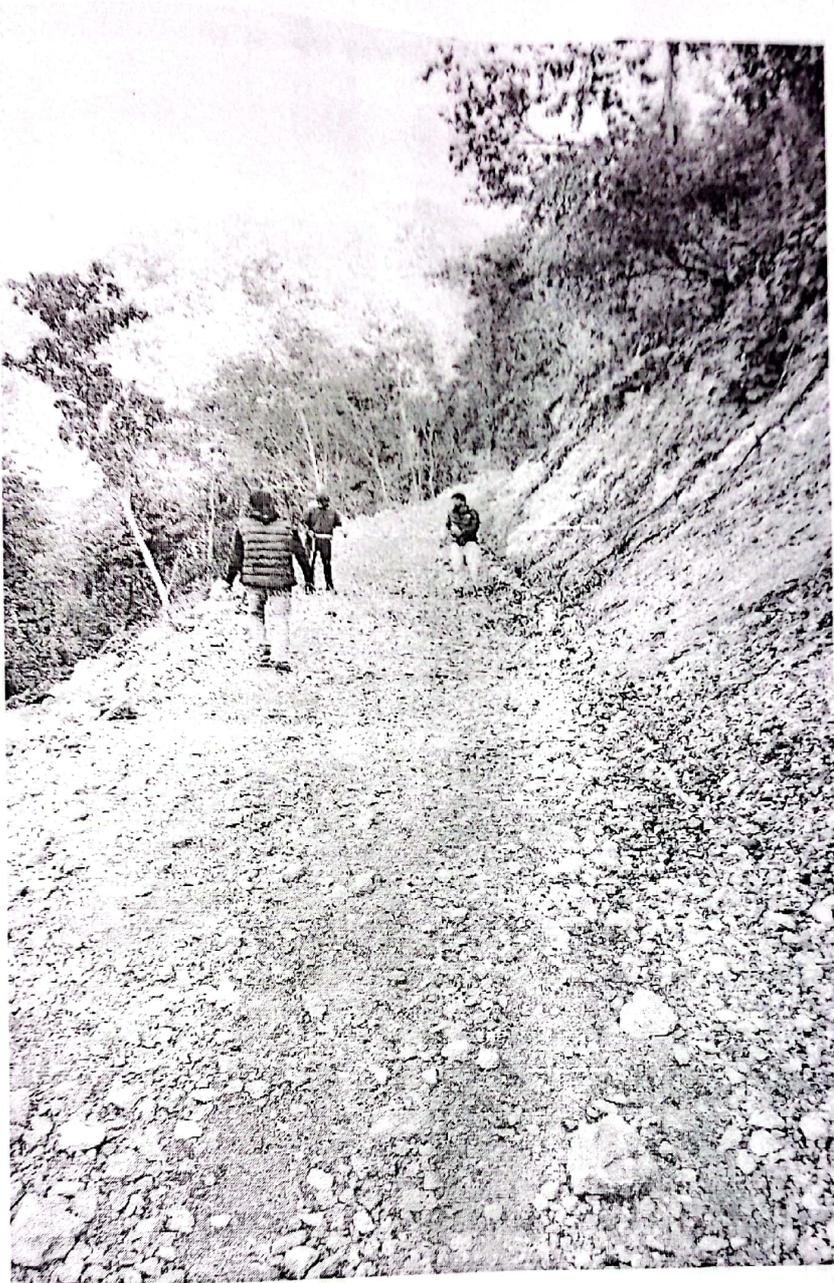

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

५. योजना शाखाको यस बर्षको कार्यको मुख्य बिषयवस्तुहरु:-

- उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन।
- निर्माण समितिको कर्तव्य भुमिका तथा जिम्मेवारी अवगत गराउने।
- परियोजनाको गुणस्तरको सुनिश्चिता।
- परियोजना अनुगमन।
- परियोजना कार्यन्वयन प्रक्रिया तथा सम्झौताको आवश्यक पर्ने कागजातहरु चेकजाँच।
- उपभोक्ता समिति परिचालनका सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान।
- निर्माण कार्यको मुल्याङ्कन।
- प्रत्येक निर्माण योजनाको अभिलेखिकरण।
- योजना खाता फाराम भर्ने।

६. यस आ.व. का मुख्य सवालहरु :-

- समयमा सम्झौता नहुने समस्या :- योजना शाखाबाट योजनाको सम्झौता कार्य नयाँ आ.व.सुरु हुने बित्तकै हुने भएता पनि उपभोक्ता समितिले चासो नदिने गर्नाले निर्माण कार्यहरु ढिलो सम्पन्न हुने गरेको।
- पेशिक रकम नपाउने समस्या:- उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु ज्यालादारिमा काम गर्ने अत्यन्त दयनिय अवस्थाका मान्छे पनि हुने गरेको पाइन्छ। यसतो अवस्थामा पेशिक नलिकान काम सुरु गर्न समस्या देखिने गरेको छ।
- जिल्ला दर रेटका कारण समस्याहरु :- सम्झौताको समयमा लागत अनुमान मा रेट एउटा हुने तर केहि समय प्रश्चात निर्माण सामग्रिको मुल्य पसलमा हवातै बढ्ने भएकोले निर्माणकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम भित्र सबै काम गुणस्तरिय बनाउन मुस्किल हुने गरेको।
- उपभोक्ता तथा निर्माण समितिले गर्दा हुने समस्या:- सुरक्षित आवास तथा दिगो विकास निर्माणका लागि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग, मापडण्ड तथा डिजाइन प्रयोग गर्न

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

आवश्यक देखिन्छ तर पुरानै चलन अनुसार काम गर्न रुचाउने समाजका कारण प्राविधिकहरुलाई समस्या भोग्नुपरेको छ।

७. मुख्य चुनौतिहरु:-

- क्षमताका आधारमा समितिका पदाधिकारिहरुको चयन।
- कार्यविधिबारे सचेतिकरण र क्षमता विकास।
- समयमा योजना सम्झौता।
- कार्यविधिको पुर्ण पालना एवम कार्यन्वयन।
- योजनाको उचित दस्तावेजिकरण र प्रमाण संकलन।
- बजार मुल्य अनुसार जिल्ला दर रेट निर्धारण।
- उचित अनुगमनको लागि प्रविधिको दिगो प्रयोग।
- उपभोक्ता समितिको यथोचित मार्गदर्शन गर्ने।
- योजनाको पुर्ण रुपमा अपनत्व ग्रहण गराउने।
- ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिका प्रयोग।

८. अवसर एवम सुझावहरु:-

- पालिकाबाट वार्षिक रुपमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन र बजेट विनियोजन।
- योजना सम्झौतामा हुने ढिलाईका कारण समयमा योजनाहरु सम्पन्न नहुने र गुणस्तरिय रुपमा सम्पन्न नहुने हुदा समयमा योजना सम्झौता गर्न जरुरी।
- समय समयमा प्राविधिकहरुको लागि नयाँ प्रविधि सम्बन्धि तालिम व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिका प्रयोगका फाइदाहरु बारे जनचेतना स्वरुप कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- योजना कार्यन्वयनका समयमा दर रेट अनुसार व्यवसायीले मालसामान बिक्रि गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन।
- योजना र लाभाम्वित घरधुरिको प्रकृति र संख्या अनुसार ५ लाख भन्दा मुनिका योजनाका लागि समेत पेस्कि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था ।
- आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिको गतिविधि अनुगमन।

योजना शाखाको बार्सिक प्रगती प्रतिवेदन

१. योजना शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू :-

- उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन।
- निर्माण समितिको कर्तव्य भूमिका तथा जिम्मेवारी अवगत गराउने।
- परियोजनाको गुणस्तरको सुनिश्चिता।
- परियोजना अनुगमन।
- परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सम्झौताको आवश्यक पर्ने कागजातहरू चेकजाँच।
- उपभोक्ता समिति परिचालनका सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान।
- निर्माण कार्यको मुल्याङ्कन।
- प्रत्येक निर्माण योजनाको अभिलेखिकरण।
- योजना खाता फाराम भर्ने।

योजनाहरूको प्रगती विवरण

प्रदेश स्तरीय योजनाहरू

क्र.स.	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगती	वित्तीय प्रगती	कैफियत
१	खानेपानी निर्माण मगर टोल मैथुम	ढकारी गा.पा. वडा नं. - ०६	३५,००,०००	१००%	१००%	
२	दलित टोल शौचालय निर्माण ढकारी -०७, अछाम	ढकारी गा.पा. वडा नं. - ०७	३०,००,०००	१००%	१००%	
३	तल्लो ठुलासेन देखि लोडेघाट सडक निर्माण	ढकारी गा.पा.	३९,००,०००	१००%	१००%	
४	डाँडा खेत सिँचाइ कुलो निर्माण	ढकारी गा.पा.	२५,००,०००	१००%	१००%	
५	तुरे सिँचाइ कुलो निर्माण	ढकारी गा.पा.	३२,५०,०००	१००%	१००%	

पालिका स्तरीय योजनाहरू

क्र.स.	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगती	वित्तीय प्रगती	कैफियत
१	गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण	ढकारी गा.पा.	५०,००,०००	१००%	७०%	
२	सार्वजनिक भवन निर्माण /मर्मत (जि.पि स्मृति भवन)	ढकारी गा.पा.	२०,००,०००	१००%	७५%	
३	फाटाबगर भलाने बान्नी लोडेघाट भिरमोड बलाता सडक निर्माण	ढकारी गा.पा.	१२,००,०००	१००%	१००%	
४	चोट्केसैन-दाउनामोडा सडक निर्माण योजना	ढकारी गा.पा.	८,००,०००	१००%	१००%	
५	गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँगको विकास लागत साझेदारी	ढकारी गा.पा.	१५,००,०००	१००%	१००%	

✓ वडा स्तरीय योजनाहरू

क्र.स.	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगती	वित्तीय प्रगती	कैफियत
१	काफलरुखसल्लेरी खा.पा.मर्मत	ढकारी वडा नं. ०७	१,५०,०००	१००%	१००%	
२	खन्टेपानीघोडाखौंद मुलसुधार	ढकारी वडा नं. ०७	५०,०००	१००%	१००%	
३	गताडि धार्मकेलस्वाड खा.पा.मर्मत	ढकारी वडा नं. ०७	२,००,०००	१००%	१००%	
४	गुयलपानीखा.पा.मर्मत	ढकारी वडा नं. ०७	१,५०,०००	१००%	१००%	
५	पगारापानीमुहानसुंजगराखालखा.पा.मर्मत	ढकारी वडा नं. ०७	१,५०,०००	१००%	१००%	
६	मुग्रापानीखा.पा.मर्मत	ढकारी वडा नं. ०७	५०,०००	१००%	१००%	
७	रानापानीमुलसुधार	ढकारी वडा नं. ०७	५०,०००	१००%	१००%	

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

क्र	परियोजनाको विवरण	ढकरी वडा नं.	अनुमानित	समाप्त	प्रगती
८	हेरपाखा ढिल्की खा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	५०,०००	१००%	१००%
९	धारा ढिल्कि कलशाती घोडाखाड सडक मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	८,५०,०००	२०%	०%
१०	मैका डाँडा बिक्रमा खण्ड बड्डा डुफा सडक निर्माण	ढकरी वडा नं. ०७	१०,००,०००	२०%	०%
११	सर-स्वतीआ.वि.शौचालय मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,००,०००	१००%	१००%
१२	बुढाखोलाखा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,५०,०००	१००%	१००%
१३	साइटिखोलास्याराआम सिँचाइ कुलो मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,००,०००	६०%	२०%
१४	स्वास्थ्यचौकी भवन मर्मत तथा सामान खरिद	ढकरी वडा नं. ०७	२,५०,०००	१००%	१००%
१५	कुन्ताखोलालिडे मेला रुज खा.पा. मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	१,५०,०००	५५%	२०%
१६	बुकाखोलाखा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	५०,०००	६७%	२०%
१७	पतान खोलाखा.पा.मर्मत	ढकरी वडा नं. ०७	२,००,०००	८०%	२०%
१८	चडिपानी मुहान पाल्ता खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	३,००,०००	१००%	१००%
१९	मनकामना मा.वि.भवन निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	२,००,०००	१००%	१००%
२०	बलाता खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	३,००,०००	१००%	१००%
२१	सूर्योदय बालविकास केन्द्र खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	२,००,०००	१००%	१००%
२२	कुल्लिमड खानेपानी मर्मत तथा कागेस्वरी आ.वि.शौचालय मर्मत	ढकरी वडा नं. ०४	४,५०,०००	१००%	१००%
२३	चोटकेसैन दाउनामारा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०४	२,००,०००	१००%	१००%
२४	बलाता स्वास्थ्य चौकी फिल्ड कटिङ्ग	ढकरी वडा नं. ०४	३,००,०००	१००%	१००%
२५	बण्डाली थान फिल्ड कटिङ्ग	ढकरी वडा नं. ०४	१,८०,०००	१००%	१००%
२६	कालिका देवी मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०४	१,५०,०००	१००%	१००%

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

२७	धौनीगाड आधुनिक घट्ट निर्माण	०४			
		ढकरी वडा नं.	८०,०००	७०%	२०%
२८	जुके खानपानी निर्माण	०४			
		ढकरी वडा नं.	३,००,०००	१००%	१००%
२९	विउरीरुख खानेपानी निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	३,००,०००	१००%	१००%
३०	रिमाडॉडा बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	१००%	१००%
३१	बण्डालीमाडु मन्दिर निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	२,५०,०००	१००%	१००%
३२	आसिपलाउने खानेपानी मर्मत	०९			
		ढकरी वडा नं.	५०,०००	१००%	१००%
३३	विध्यानिवास आ.वि. भवन मर्मत	०९			
		ढकरी वडा नं.	२,००,०००	८०%	०%
३४	खडिकारुख मुहान बजारखाल खानेपानी मर्मत	०९			
		ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
३५	धामीबगे खानेपानी मर्मत	०९			
		ढकरी वडा नं.	३,००,०००	८०%	२०%
३६	डुफा गाऊँघर क्लिनिक भवन निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	८०%	२०%
३७	बण्डालीमाडु मन्दिर निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	२,५०,०००	८०%	२०%
३८	घुडखोला सिंचाई कुलो निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
३९	सिन्कीधारा खानेपानी निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
४०	गौरैलाखोला खानेपानी मर्मत	०९			
		ढकरी वडा नं.	५०,०००	८०%	२०%
४१	जबदमुहान काफलरुख खानेपानी निर्माण	०९			
		ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	१००%	१००%
४२	धाराखाल खेरेचौकी बास्खोला खानेपानी निर्माण	०८			
		ढकरी वडा नं.	१,२०,०००	१००%	१००%
४३	केलाडी नवखेत डडेय खानेपानी निर्माण	०८			
		ढकरी वडा नं.	७०,०००	१००%	१००%
४४	बासपानी खकानेपानी मुलसुधार	०८			
		ढकरी वडा नं.	५०,०००	१००%	१००%

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

४५	डुमप-नी खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४६	सिलीपडा डाडाथाई खानेपानीमर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४७	आरन व्यवस्थापन (टेक बहादुर बि.क.)	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	१००%	१००%
४८	वि.पि स्मृति आ.वि. भबवन मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	१००%	१००%
४९	गत आ.व को विधुत जडान तिर्न बाँकी	ढकरी वडा नं. ०८	१,२८,०००	१००%	१००%
५०	सुगरखाल खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
५१	शिशु सुधार आ.वि. खेलमैदान निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,७५,०००	८०%	२०%
५२	मंग्या कालिकाथान मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	२,००,०००	८०%	२०%
५३	फासडुग्या पितर मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,२०,०००	८०%	२०%
५४	पिटुकाखोला साजडाँडा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
५५	देवल देउतिबज्यै मन्दिर धेरापर्खाल निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	१,३०,०००	८०%	२०%
५६	मेल्लाखाल कालिकाथान मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	२,००,०००	८०%	२०%
५७	घोडासैन स्वास्थ्य चौकी शौचालय मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	८०%	२०%
५८	पिरपले खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
५९	ठाँटिखाल पिपल चौतारो निर्माण	ढकरी वडा नं. ०८	७०,०००	८०%	२०%
६०	खानेपानी तथा सिँचाइको लागी पाइप खरिद	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
६१	त्रिपुरासुन्दरी मा.वि. सि.सि.क्यामेरा जडान	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
६२	ठुलागडा खानेपानी मर्मत	ढकरी वडा नं. ०८	५०,०००	८०%	२०%
६३	सोतर फाल्ने खोला मुहान खानेपानी	ढकरी वडा नं.	६०,०००	१००%	१००%

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

मर्मत					
६४	पञ्चज्योति आ.वि. खानेपानी मर्मत	०६ ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	१००%	१००%
६५	शान्ति आ.वि. फर्निचर निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	८०,०००	१००%	१००%
६६	खडिपानी ग्रामीण सडक निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	१५,००,०००	२०%	०%
६७	धानचौड सडक निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	८,००,०००	२०%	०%
६८	पञ्चकन्या आ.वि. घेरा पर्खाल निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	३,००,०००	१००%	१००%
६९	काउलेगडा खानेपानी निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	१,००,०००	१००%	१००%
७०	पडापानी नवदुर्गा मनकामना आ.वि.सडक निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	५,३०,०००	१००%	१००%
७१	बासैन ग्रामिण सडक निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	३,५०,०००	१००%	१००%
७२	सिम गाड खानेपानी निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
७३	तल्लो स्वाड सिँचाइ कुलो निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	५,००,०००	८०%	२०%
७४	भरकुडा खानेपानी मर्मत	०६ ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
७५	बराखर्क खानेपानी मर्मत	०६ ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
७६	पुछेला गौराघर सिमाने खानेपानी निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	८०%	२०%
७७	मिल खेत सिँचाइ पोखरी निर्माण	०६ ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	८०%	२०%
७८	मष्टा देवता मन्दिर मर्मत	०६ ढकरी वडा नं.	१,००,०००	८०%	२०%
७९	गतेपानी खानेपानी निर्माण	०३ ढकरी वडा नं.	२,००,०००	१००%	१००%
८०	गैरीखोला मुहान पारी गडेम खानेपानी निर्माण	०३ ढकरी वडा नं.	१,५०,०००	१००%	१००%
८१	नायकबाडा खानेपानी निर्माण	०३ ढकरी वडा नं.	१,००,०००	१००%	१००%

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

८२	छणाखोला मुहान तल्लो बागबते कानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%	
८३	कालिका मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	२,००,०००	१००%	१००%	
८४	मालिका आ.वि. शौचालय निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%	
८५	स्याङ्लावन माटेथान निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%	
८६	तल्लो बागबते सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,५०,०००	१००%	१००%	
८७	वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको चेन गेट निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	२,००,०००	१००%	१००%	
८८	माटिखड्डेन मुहान झ्याडिसल्ला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%	
८९	गोठामेला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	१,००,०००	१००%	१००%	
९०	तल्लो रिखेनाउला खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३	५०,०००	१००%	१००%	
९१	जुकेपानी मुहान मुललो ठूलासेन खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३		८०%	२०%	
९२	कनेपानी मुहान ताली खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३		८०%	२०%	
९३	रिखेनाला मुहान ढङ्नेटा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०३		८०%	२०%	
९४	डुमबाडडा मुहान सुनातबाडा खानेपानी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०२	९०,०००	१००%	१००%	
९५	टुनिगैरा सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	२,००,०००	१००%	१००%	
९६	भुजनी सिँचाइ पोखरी निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%	
९७	जनमन्दिर मा.वि फर्निचर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	१००%	
९८	जाल्पादेवी मन्दिर निर्माण	ढकरी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%	
९९	ढकरी गा.पा. वडा नं. २ र ५ को सबै योजनाहरू सम्झौता भईसकेको	ढकरी गा.पा. वडा नं. ०२ र ०५	काम सबै सम्पन्न भएको	१००%	२०%	

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

१००	टुनिगैरा सिंचाइ पोखरी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	२,००,०००	१००%	१००%
१०१	भुजनी सिचाइ पोखरी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%
१०२	जनमन्दिर मा.वि फर्निचर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	१००%
१०३	जाल्पादेवी मन्दिर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	१००%
१०४	साजरुख खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	२०%
१०५	कापडाखोला खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	२०%
१०६	कनेडारुख खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	२०%
१०७	चैनपुर स्वास्थ्य चौकी खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	२०%
१०८	मल्लोलेक खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	२०%
१०९	सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई मैकाडॉडा फर्निचर व्यवस्थापन	ढकारी वडा नं. ०५	५०,०००	१००%	२०%
११०	केलामुल खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	२०%
१११	बुडाखोला सिचाई कुलो मर्मत	ढकारी वडा नं. ०५	२,००,०००	१००%	२०%
११२	कालसैन थान निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	२०%
११३	भैरवथान मन्दिर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	२०%
११४	नवदुर्गा मन्दिर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,५०,०००	१००%	२०%
११५	ज्ञानमन्दिर फर्निचर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	२०%
११६	गोकुल आ.वि. फर्निचर निर्माण	ढकारी वडा नं. ०५	१,००,०००	१००%	२०%
११७	बलातीवाडा फाटाबगर ग्राविल तथा सडक मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	४,००,०००	२०%	१००%
११८	कालिका देवि मा.वि. खानेपानी निर्माण योजना	ढकारी वडा नं. ०२	४,००,०००	२०%	०%
११९	वडा कार्यालय गेट निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	२,५०,०००	१००%	१००%
१२०	गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	३,००,०००	१००%	१००%
१२१	माखण सिंचाइ पोखरी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,०००	१००%	१००%
१२२	गाणेपानी मुहान नेपाली टोल खा.पा.निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	१,५०,०००	१००%	२०%
१२३	बुडाखोला मुहान सिंहेटोल लहरबाडा खानेपानी निर्माण	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,०००	१००%	१००%
१२४	साजखोला पोखरी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	९०,०००	१००%	१००%
१२५	छोटा भलाने खा.पा. मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५०,०००	१००%	१००%

योजना शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

१२६	जुन बग्ने ठकुरी टोल बलातीबाडा खा.पा.	ढकारी वडा नं. ०२	२,८०,०००	१००%	१००%	
१२७	तल्लो भकुण्डेगडा खा.पा.मुलसुधार	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,०००	१००%	२०%	
१२८	बण्डालीमाडु खा.पा मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५०,०००	१००%	२०%	
१२९	चलाउने टोल फाटाबगर खा.पा. मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५२,०००	१००%	१००%	
१३०	हिच्मा स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,०००	१००%	१००%	
१३१	दुन्ता बालविकास केन्द्र फर्निचर खरिद	ढकारी वडा नं. ०२	५०,०००	१००%	२०%	
१३२	श्री जानदीप बालविकास केन्द्र खानेपानी मर्मत	ढकारी वडा नं. ०२	५०,०००	१००%	१००%	
१३३	वडा कार्यालय फर्निचर खरीद	ढकारी वडा नं. ०२	१,००,०००	१००%	१००%	

निष्कर्ष:-

आ.व. २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म लगभग सबै योजनाहरुको भुक्तानी भइसकेको छ। निर्माण कार्यहरुको अनुगमन गरी सम्पन्न भइसकेका निर्माण योजनाहरुको अन्तिम बिल पेश गरियो केहि मात्रामा योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन्। सम्पन्न भइसकेका निर्माण योजनाहरु गुणस्तरिय एवं विवाद रहित रुपमा सम्पन्न भएका छन्। बहुबर्षिय ठेक्काका योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन्।

पेश गर्ने :-

.....
 (चन्दा कुमारी चौधरी)
 योजना शाखा प्रमुख
